

◇建設工事の進捗状況

平成 25 年 4 月 16 日撮影 (笹ヶ瀬川堤防より撮影)

工事着手前です。




平成 25 年 5 月 10 日撮影 (西消防署より撮影)

建築工事杭打ち工事を施工しています。



平成 25 年 5 月 14 日撮影（西消防署より撮影）

建築杭打ち工事に合わせ、貯留ヤード基礎工事に着手しています。

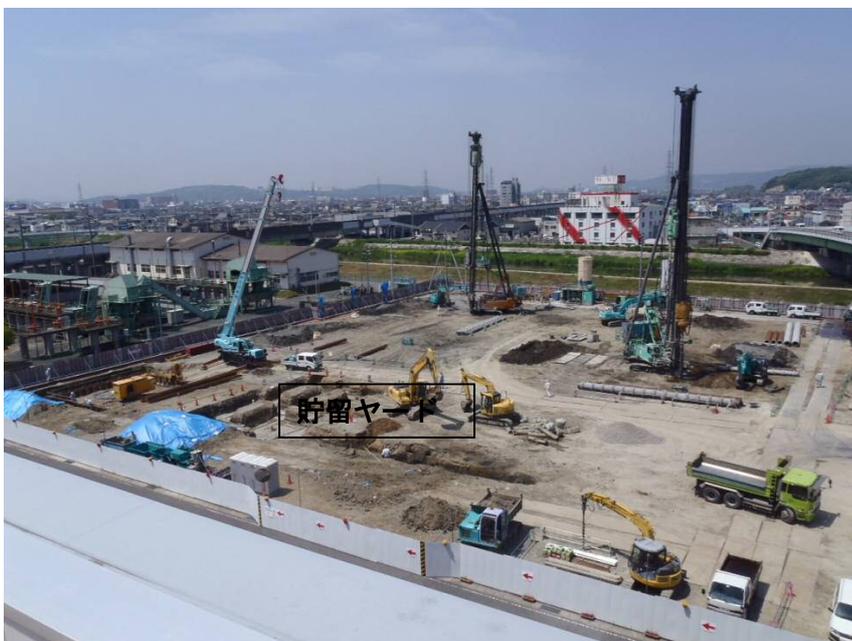


平成 25 年 5 月 24 日撮影（西消防署より撮影）

建築杭打ち工事が終わり、受入れ貯留ヤードの基礎工事に着手しています。




平成 25 年 6 月 7 日（西消防署より撮影）

地下ピット部分の掘削工事に着手しています。

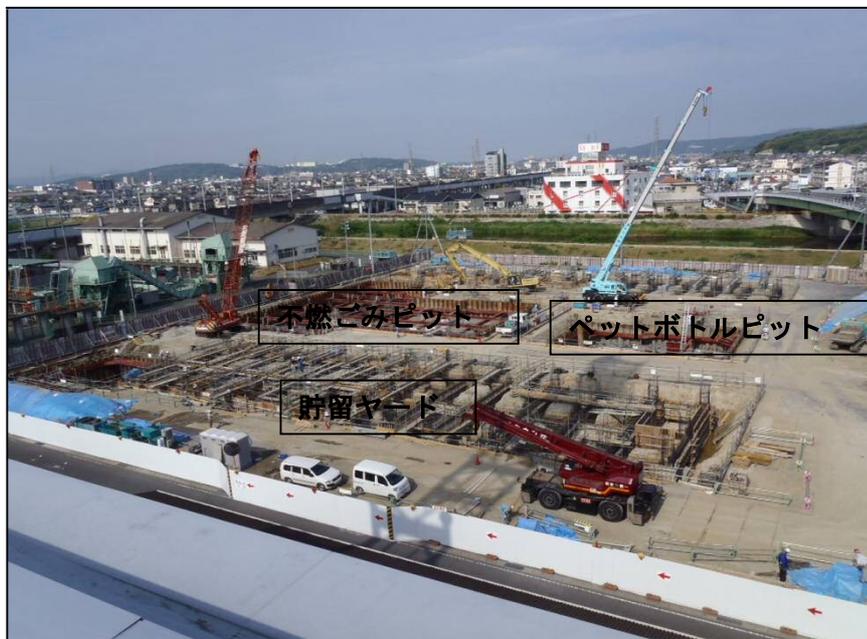


平成 25 年 6 月 28 日撮影（西消防署より撮影）

貯留ヤードの基礎工事、地下ピット部分の掘削工事を行っています。

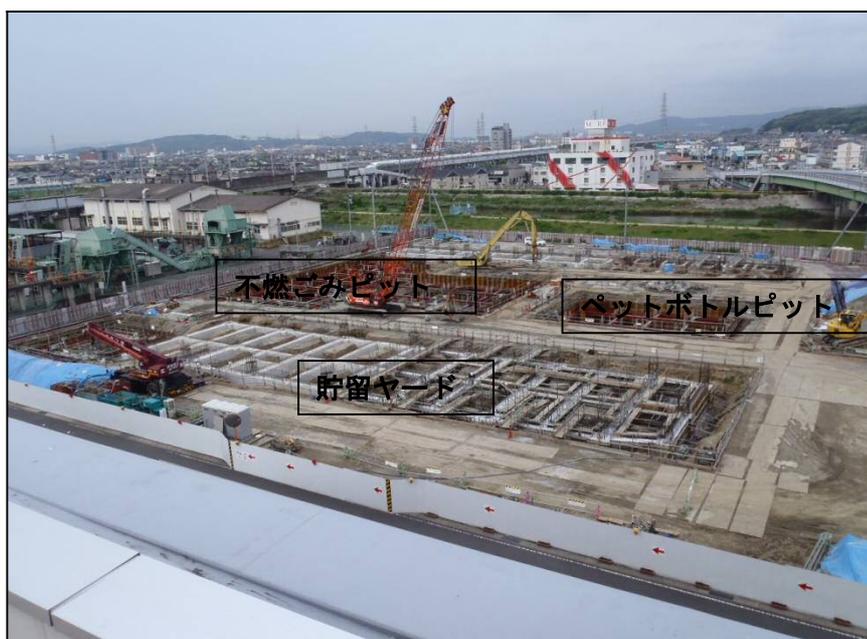

平成 25 年 7 月 12 日撮影（西消防署より撮影）

貯留ヤードの基礎工事、地下ピット部分の掘削工事を行っています。

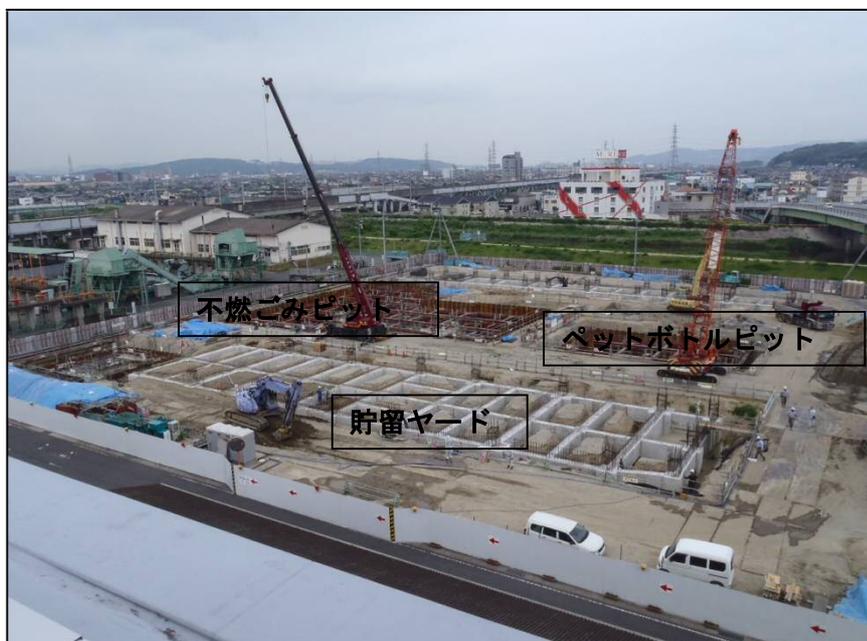

平成 25 年 7 月 26 日撮影（西消防署より撮影）

貯留ヤードの基礎工事、地下ピット部分の躯体工事に着手しています。

