

社会資本総合整備計画 事後評価

計画名：岡山市宅地耐震化推進事業（防災・安全）

岡 山 市

令和2年3月

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年03月31日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----|---|----|---|---|---|---|-----------|---|-------------------------|---|---|
| 計画の名称 | 岡山市宅地耐震化推進事業（防災・安全） | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成29年度～平成31年度（3年間） | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ | | | |
| 交付対象 | 岡山市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 市域内の大規模盛土造成地の位置及び規模を変動予測調査の実施により把握するとともに、調査結果を広く市民に情報提供することにより、宅地耐震化への理解と防災意識の向上・減災を目指す。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 10 | A | 10 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|--|------------------|-----------------|-----------------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 (H29当初) | 中間目標値 (H29末) | 最終目標値 (H31末) |
| 1 | 市域内の大規模盛土造成地の変動予測調査（第0次スクリーニング）を行い 市域内のスクリーニング調査対象地域の設定等を行う面積（224?）の調査実施割合 | 0% | 100% | 100% |
| 2 | 滑動崩壊の危険性が高い大規模盛土造成地の位置及び規模を把握し、その結果を市民に情報提供する 第一次スクリーニング調査により、大規模盛土造成地の位置と規模を把握し、その結果を市民に提供する割合 | 0% | 0% | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | — | 国土強靱化を含む | ○ | 定住自立圏を含む | — | 連携中枢都市圏を含む | — | 流域水循環計画を含む | — | 地域再生計画を含む | — |
| 岡山市国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A1-1 | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------------|----|-----|----|-----|-----|-----|---------------------|---------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|--|--|
| 基幹事業（大） | 番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名／ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | | | |
| | | 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | | | | | | | H29 | H30 | H31 | R02 | R03 | | | | | | |
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市街地整備事業 | A13-001 | 宅地耐震 | 一般 | 岡山市 | 直接 | 岡山市 | — | — | 大規模盛土造成地の変動 予測調査 | 第0次スクリーニング 第一 次スクリーニング | 岡山市 | ■ | ■ | ■ | | | 10 | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

岡山市において当該社会資本総合整備計画関係課メンバーにより事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和2年3月

公表の方法

岡山市HPに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・市域内の大規模盛土造成地の位置及び規模を把握することが出来た
- ・調査結果を市民に情報提供することにより、宅地耐震化への理解と防災意識の向上が図れた


定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

| ○目標値の達成状況 | | |
|-----------------------------|---------|----------------|
| 番号 | 指標（略称） | |
| | 目標値／実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 最終目標値 | 100% |
| | 最終実績値 | 100% |
| 市域内の第0次スクリーニングの調査実施割合 | | |
| 整備計画に従い、事業を実施することが出来た | | |
| 2 | 最終目標値 | 100% |
| | 最終実績値 | 100% |
| 大規模盛土造成地の位置と規模の把握及び市民への情報提供 | | |
| 整備計画に従い、事業を実施することが出来た | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

社会資本総合整備計画

| | | | |
|-------|---------------------|---------|-----|
| 計画の名称 | 岡山市宅地耐震化推進事業（防災・安全） | 重点計画の該当 | ○ |
| 計画の期間 | 平成29年度～平成31年度（3年間） | 交付対象 | 岡山市 |

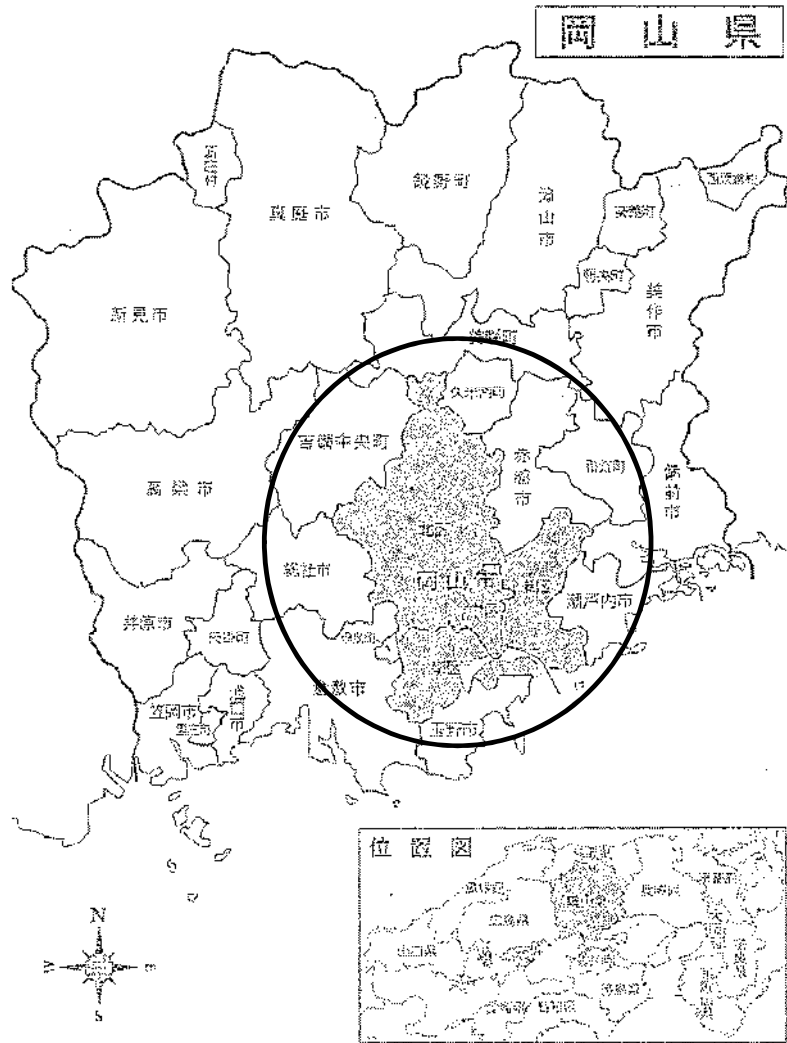

1 事業主体:岡山市

宅地耐震化推進事業(0次調査 調査対象地域の設定等)
 調査対象地域面積:224Km²
 (林野及び埋立地、干拓地、後背湿地等を除く)

2 事業主体:岡山市

宅地耐震化推進事業(第一次スクリーニング 盛土造成地の位置と規模の把握)
 調査対象面積:4km²
